Neubau einer 2-fach Sporthalle in Siegburg
Bauherr: Kreisstadt Siegburg

Rahmenterminplan
VORABZUG

generalplaner - architekten - ingenieure

[sic!]
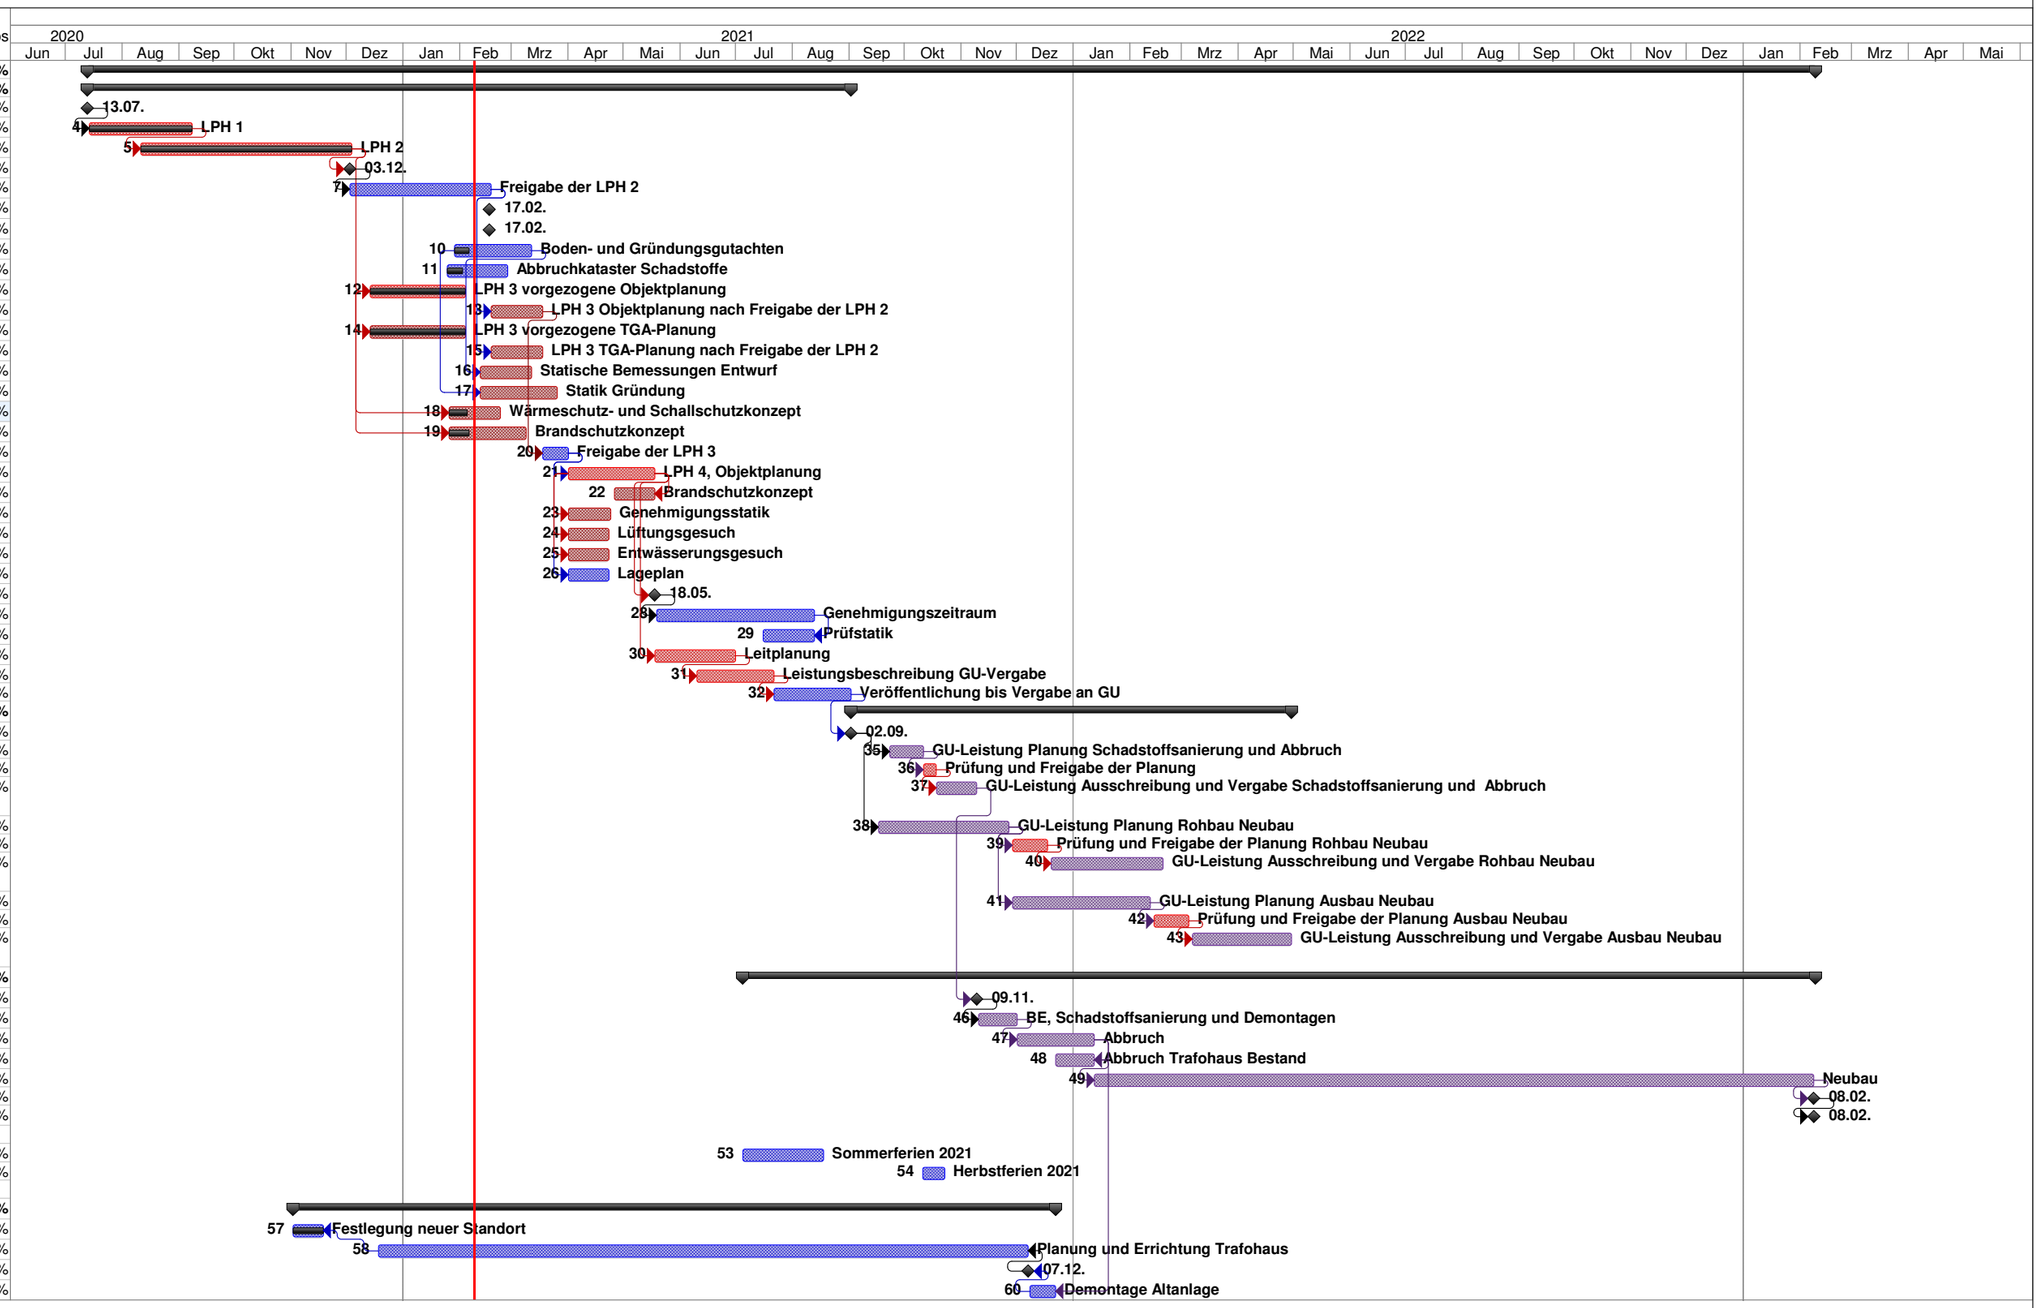
Nr.	Dauer	Anfang	Fertig stellen	% geschlos
1	**656,5 Tage**	**Mo 13.07.20**	**Do 09.02.23**	**16%**
2	**287 Tage**	**Mo 13.07.20**	**Mi 01.09.21**	**30%**
3	1 Tag	Mo 13.07.20	Mo 13.07.20	100%
4	2 Monate	Di 14.07.20	Mo 07.09.20	100%
5	4,15 Monate	Di 11.08.20	Do 03.12.20	100%
6	0 Tage	Do 03.12.20	Do 03.12.20	100%
7	49 Tage	Do 03.12.20	Mi 17.02.21	0%
8	1 Tag	Mi 17.02.21	Mi 17.02.21	0%
9	1 Tag	Mi 17.02.21	Mi 17.02.21	0%
10	6 Wochen	Fr 29.01.21	Do 11.03.21	20%
11	5 Wochen	Mo 25.01.21	Fr 26.02.21	25%
12	32 Tage	Mo 14.12.20	Mi 03.02.21	100%
13	4 Wochen	Do 18.02.21	Mi 17.03.21	0%
14	32 Tage	Mo 14.12.20	Mi 03.02.21	100%
15	4 Wochen	Do 18.02.21	Mi 17.03.21	0%
16	4 Wochen	Fr 12.02.21	Do 11.03.21	0%
17	6 Wochen	Fr 12.02.21	Do 25.03.21	0%
18	4 Wochen	Di 26.01.21	Mo 22.02.21	40%
19	6 Wochen	Di 26.01.21	Mo 08.03.21	30%
20	2 Wochen	Do 18.03.21	Mi 31.03.21	0%
21	1,5 Monate	Do 01.04.21	Mo 17.05.21	0%
22	3 Wochen	Mo 26.04.21	Mo 17.05.21	0%
23	3 Wochen	Do 01.04.21	Fr 23.04.21	0%
24	14 Tage	Do 01.04.21	Do 22.04.21	0%
25	14 Tage	Do 01.04.21	Do 22.04.21	0%
26	14 Tage	Do 01.04.21	Do 22.04.21	0%
27	1 Tag	Di 18.05.21	Di 18.05.21	0%
28	3 Monate	Mi 19.05.21	Do 12.08.21	0%
29	4 Wochen	Fr 16.07.21	Do 12.08.21	0%
30	1,5 Monate	Di 18.05.21	Mi 30.06.21	0%
31	1,5 Monate	Do 10.06.21	Mi 21.07.21	0%
32	1,5 Monate	Do 22.07.21	Mi 01.09.21	0%
33	**166 Tage**	**Do 02.09.21**	**Fr 29.04.22**	**0%**
34	1 Tag	Do 02.09.21	Do 02.09.21	0%
35	2,5 Wochen	Do 23.09.21	Mo 11.10.21	0%
36	1 Woche	Mo 11.10.21	Mo 18.10.21	0%
37	3 Wochen	Mo 18.10.21	Di 09.11.21	0%
38	2,5 Monate	Fr 17.09.21	Fr 26.11.21	0%
39	3 Wochen	Mo 29.11.21	Fr 17.12.21	0%
40	2 Monate	Mo 20.12.21	Fr 18.02.22	0%
41	2,5 Monate	Mo 29.11.21	Fr 11.02.22	0%
42	3 Wochen	Mo 14.02.22	Fr 04.03.22	0%
43	2 Monate	Mo 07.03.22	Fr 29.04.22	0%
44	**412,5 Tage**	**Mo 05.07.21**	**Do 09.02.23**	**0%**
45	1 Tag	Di 09.11.21	Mi 10.11.21	0%
46	3 Wochen	Mi 10.11.21	Mi 01.12.21	0%
47	5 Wochen	Mi 01.12.21	Mi 12.01.22	0%
48	10 Tage	Mi 22.12.21	Mi 12.01.22	0%
49	14 Monate	Mi 12.01.22	Mi 08.02.23	0%
50	0 Tage	Mi 08.02.23	Mi 08.02.23	0%
51	1 Tag	Mi 08.02.23	Do 09.02.23	0%
52				
53	32 Tage	Mo 05.07.21	Di 17.08.21	0%
54	10 Tage	Mo 11.10.21	Fr 22.10.21	0%
55				
56	**285,5 Tage**	**Mo 02.11.20**	**Mi 22.12.21**	**5%**
57	2,5 Wochen	Mo 02.11.20	Mi 18.11.20	100%
58	12 Monate	Fr 18.12.20	Di 07.12.21	0%
59	1 Tag	Di 07.12.21	Mi 08.12.21	0%
60	2 Wochen	Mi 08.12.21	Mi 22.12.21	0%
